COMUNE DI ROMA
UFFICIO PIANIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
IX DIPARTIMENTO U.O. N. 3
attuazione della legge 18 aprile 1962 n. 167
SECONDO PIANO DELLE ZONE

P. di Z. B50 - MONTESTALLONARA



REALIZZAZIONE DI OO.UU. PRIMARIE A SCOMPUTO DEGLI ONERI CONCESSORI
(LEGGE N° 865/71 E 1187/68)

PROGETTO DEFINITIVO - 1° STRALCIO

PROPONENTE:	ENTE DI COORDINAMENTO:	UFFICIO RICEVENTE:
CONSORZIO MONTESTALLONARA	I.S.V.E.UR. S.p.a. COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE: Ing. Carmelo Urzi e-mail: urzi.carmelo@fastwebnet.it	

PROGETTAZIONE:	RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE:	EMISSIONE:
PROGETTO URBANO s.r.l. e-mail: progettourbano@gmail.com	Ing. Francesco Chiocchi RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Stephen Arlo Chiocchi	MARZO 2012 AGGIORNAMENTI: AGG. 1: AGG. 2: AGG. 3:

COD. STRALCIO	TITOLO ELABORATO:	SCALA:
S_1	ALLEGATO 2 AL PSC REALIZZAZIONE SCAVI FOGNATURE	—
COD. ELAB.: PSC		NOME FILE:
N° ELAB.: 02.2		10.01_AL D-Relazione scavi fognature.dwg
		N° PROGRESSIVO: 65.3

FASI COSTRUTTIVE FOGNATURE

FASE A

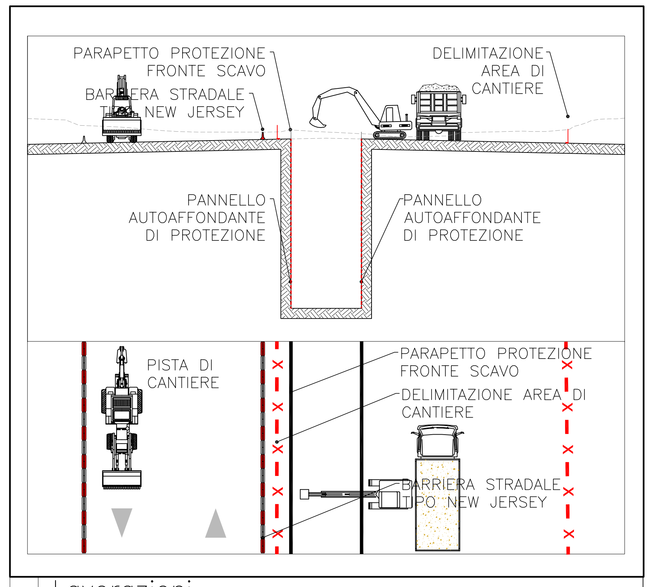

A

Lavorazioni
- Delimitazione area d'intervento e allestimento cantiere
- Esecuzione scavo per la posa del collettore principale acque bianche
- Apposizione pannello autoaffondante di protezione

Rischi

Rif. PSC
D. ANALISI DELLE FASI, LAVORAZIONI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Prescrizioni
- Recinzione area di cantiere
- Parapetto di protezione bordo scavo
- DPI SPECIFICI — Pannello autoportante di protezione scavo

FASE B

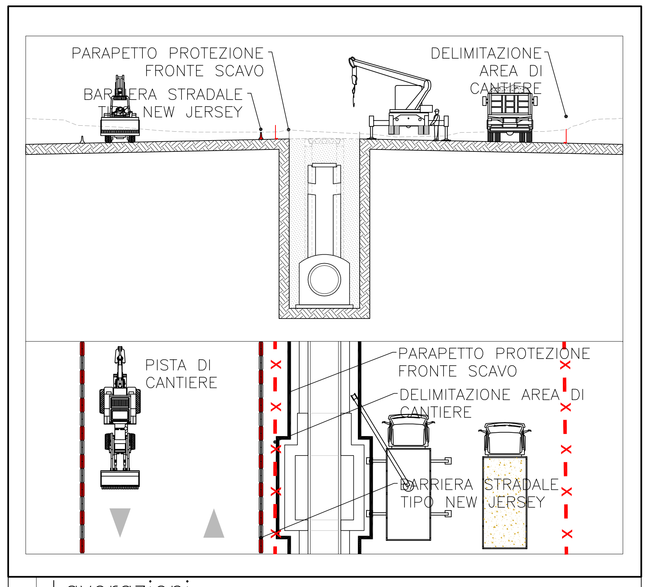

B

Lavorazioni
- Posa collettore principale bianche e pozzetti
- Rinfianco e rinterro fino alla fondazione stradale
- Predisposizione allacci per le caditoie
- Rinfianco e rinterro fino alla fondazione stradale

Rischi



Rif. PSC
D. ANALISI DELLE FASI, LAVORAZIONI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Prescrizioni
- Recinzione area di cantiere
- Parapetto di protezione bordo scavo
- DPI SPECIFICI

FASE C

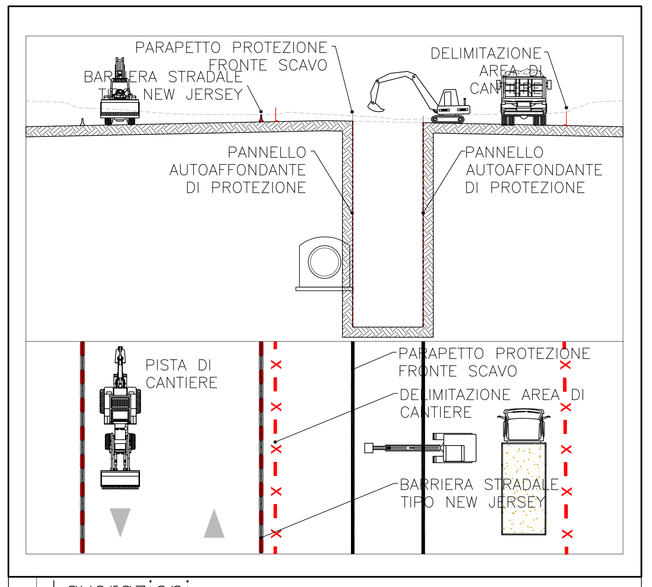

D

Lavorazioni
- Delimitazione area d'intervento e allestimento cantiere
- Esecuzione scavo per la posa del collettore principale acque nere
- Apposizione pannello autoaffondante di protezione

Rischi

Rif. PSC
D. ANALISI DELLE FASI, LAVORAZIONI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Prescrizioni
- Recinzione area di cantiere
- Parapetto di protezione bordo scavo
- DPI SPECIFICI — Pannello autoportante di protezione scavo

FASE D

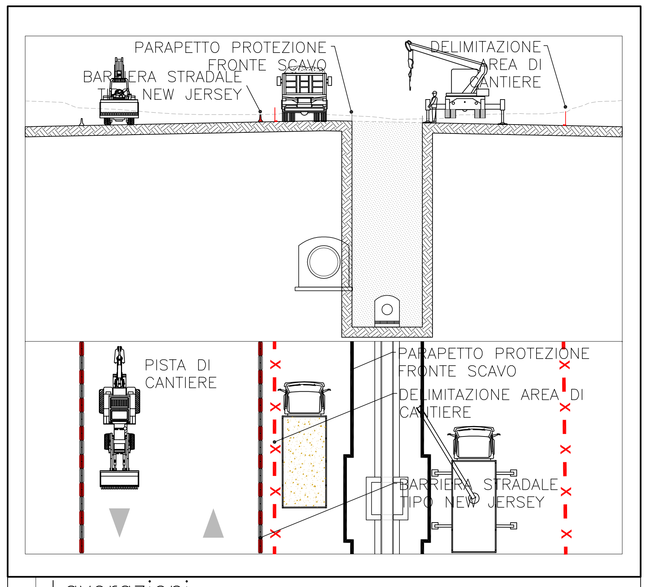

E

Lavorazioni
- Posa collettore principale nere e pozzetti
- Rinfianco e rinterro fino alla fondazione stradale

Rischi



Rif. PSC
D. ANALISI DELLE FASI, LAVORAZIONI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Prescrizioni
- Recinzione area di cantiere
- Parapetto di protezione bordo scavo
- DPI SPECIFICI

FASE F

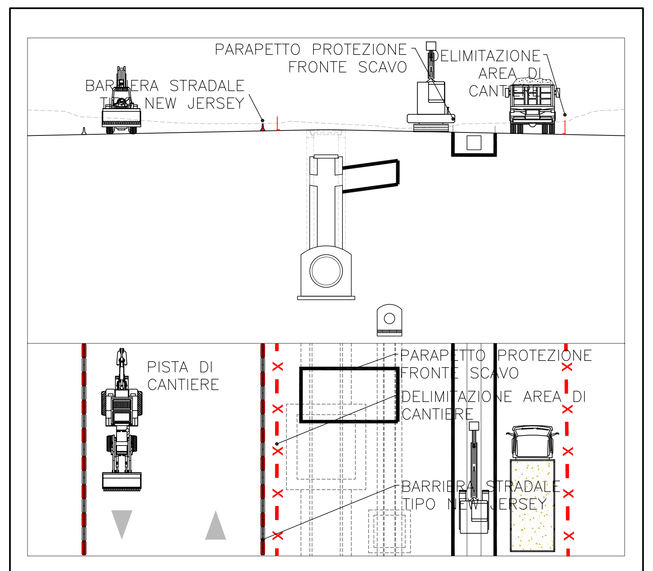

F

Lavorazioni
- Esecuzione scavo lineare e posa delle controcigliature
- Esecuzione scavo per posa del collettore secondario acque di prima pioggia

Rischi



Rif. PSC
D. ANALISI DELLE FASI, LAVORAZIONI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Prescrizioni
- Recinzione area di cantiere
- Parapetto di protezione bordo scavo
- DPI SPECIFICI

FASE G

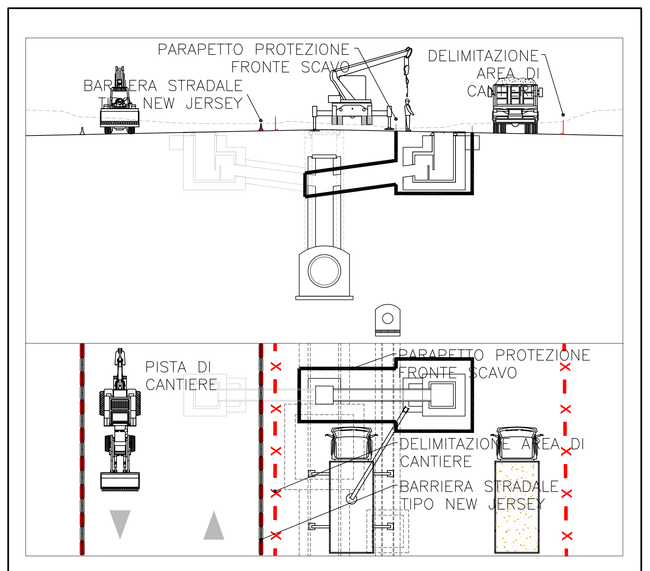

G

Lavorazioni
- Posa delle caditoie stradali e dei fognoli DN 315 lato destro
- Posa del collettore secondario acque prima pioggia lato destro

Rischi



Rif. PSC
D. ANALISI DELLE FASI, LAVORAZIONI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Prescrizioni
- Recinzione area di cantiere
- Parapetto di protezione bordo scavo
- DPI SPECIFICI

FASE H

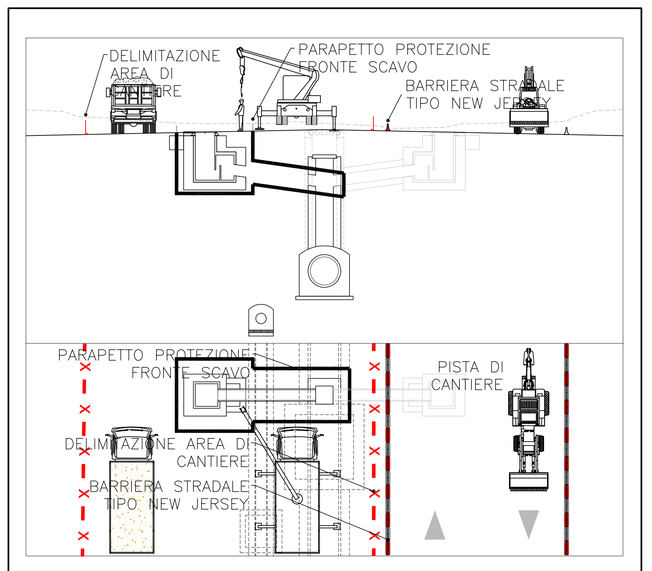

H

Lavorazioni
- Rinfianco e rinterro fino alla fondazione stradale lato sinistro
- Posa del pacchetto della fondazione stradale lato sinistro

Rischi



Rif. PSC
D. ANALISI DELLE FASI, LAVORAZIONI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Prescrizioni
- Recinzione area di cantiere
- DPI SPECIFICI

FASE I

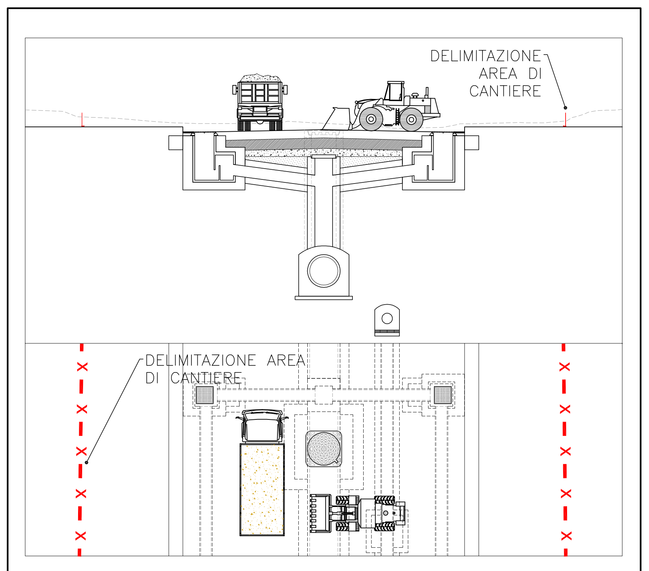

I

Lavorazioni
- Rinfianco e rinterro fino alla fondazione stradale
- Posa del pacchetto della fondazione stradale

Rischi



Rif. PSC
D. ANALISI DELLE FASI, LAVORAZIONI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Prescrizioni
- Recinzione area di cantiere
- DPI SPECIFICI
