




ROMA CAPITALE  
 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE URBANISTICA  
 DIREZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE E PUBBLICA  
 SEZIONE SERVIZI E SERVIZI PER IL CITTADINO  
 SERVIZIO LAVORO BELLE SUE

**P. di Z. B50 - MONTESTALLONARA**

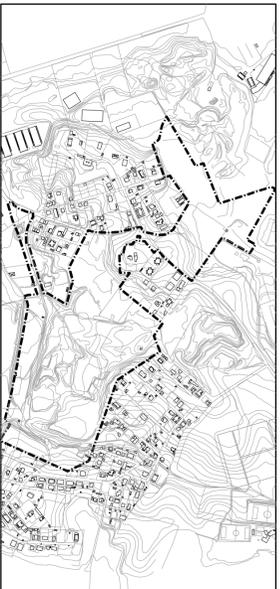

REALIZZAZIONE DI OO.UU. PRIMARIE A SCOMPIUTO DEGLI ONERI CONCESSORI  
 (L. 50/04 n° 4748 e 73494)  
**PROGETTO DEFINITIVO - 1° STRALCIO**

PROPRIONE: CONSORZIO MONTESTALLONARA	ENTE DI GOVERNAMENTO: I.S.V.E.U.R. S.p.a.	UFFICIO RISPONDE: 
---	--	-----------------------

PROGETTAZIONE: PROGETTO URBANO s.r.l. <small>www.progettoprogettazione.com</small>	RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE: Ing. Francesco Chioccoli	AGGIORNAMENTI: Art. 1: Novembre 2010 Art. 2: Aprile 2011 Art. 3: Maggio 2011
GRUPPO DI PROGETTAZIONE: Ing. Stephen Aldo Chioccoli		

COD. STRALCIO: <b>S_3</b>	TITOLO ELABORATO: <b>CRONOPROGRAMMA</b>	SCALA: _____
COD. ELAB. <b>GE</b>		NOME FILE: _____
N° ELAB. <b>08</b>		DELA, CRONOLOGIA/ALMA N° PROGRESSIVO: <b>8</b>

P. di Z. B50 - MONTESTALLONARA 1° STRALCIO			PARZIALE SETTIMANE	DURATA MESI	MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7
ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CANTIERE			6								
FOGNATURA PRINCIPALE BIANCA E MANUFATTI DI VALLE											
RETE FOGNARIA BIANCA A GRANTIA'			16								
FOGNATURA PRINCIPALE NERA E RIMOZIONE DELLA PREMENTE DISMESSA											
FOGNA NERA A GRANTIA'			16								
FOGNA NERA IN PRESSIONE-PREMENTE N° 1			8								
FOGNA NERA IN PRESSIONE-PREMENTE N° 3			6								
RIMOZIONE DELLA PREMENTE DISMESSA			4								
DRENAGGI			10								
MANUFATTI VASCA DI ACCUMULO ACQUA DI PRIMA PIOGGIA											
VASCA 1A			10								
VASCA 1B			7								
STRADE MARCIAIEDI SEGNALETICA			8								
MURI			16								
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO											
"MONTESTALLONARA"			16								
PONTE STRADALE			16								
RIMOZIONE APRESTAMENTI DI CANTIERE			6								
durata dei lavori			7 mesi								

Redazione e approvazione del progetto esecutivo  
Squadra organizzazione cantiere  
Squadra rete di forniture a gravità  
Squadra rete di forniture in pressione  
Squadra opere in c.a.  
Squadra opere stradali
